

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une foi



MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE, DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE ET DE L'ÉQUITÉ
SOCIALE ET TERRITORIALE



PROGRAMME
D'URGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Un levier pour l'essor du monde rural

Bulletin d'information périodique

Août 2023

N°1

L'actualité du Programme d'Urgence de Développement Communautaire

Sommaire

Mot du Coordonnateur National **1**

État d'avancement des différents volets du PUDC **3**

Carte Postale - Dar Salam (Tambacounda) **8**

Zoom sur le Projet d'Électrification de 2000 Villages **10**

PUDC en chiffres **13**

Maintenir le cap pour continuer à imprimer notre marque dans le monde rural

La mise en œuvre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) sur la base des orientations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a permis d'améliorer de manière significative les conditions de vie des populations. Pour rappel, il avait théorisé et fait adhérer la majorité des Sénégalais au concept d'équité; en mettant l'accent sur un nouvel ordre de priorités afin que les plus vulnérables d'entre nous bénéficient d'investissements conséquents pour aspirer à un mieux-être, mais aussi, bénéficier de conditions favorables pour un épanouissement économique et social.

“Avec la mise en œuvre du PUDC, beaucoup de réalisations ont été faites en milieu rural.”

C'est ainsi que depuis 2015, avec la mise en œuvre du PUDC, beaucoup de réalisations ont été faites en milieu rural. S'agissant du désenclavement, près de 827 kilomètres de pistes rurales sont achevés, permettant le désenclavement de 844 localités. Pour le volet équipements post-récoltes, 5 349 équipements ont été distribués aux groupements bénéficiaires dans 4 874 villages. Dans le domaine de l'hydraulique rurale, les ouvrages mis en service ont permis de fournir de l'eau potable à plus de 642 000 personnes dans 1 848 villages. Concernant l'électrification rurale, ce sont 837 villages qui ont été finalisés et plus de 760 000 personnes impactées.

Dans cette dynamique, des efforts soutenus doivent être consacrés à la poursuite et à la finalisation des travaux dans le cadre du projet financé avec l'appui de la Banque Islamique de Développement (BID), aux travaux du projet avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et du projet d'électrification de 2000 villages, ainsi qu'au démarrage effectif des travaux dans le cadre du projet financé avec l'appui du Fonds Saoudien de Développement (FSD). La tâche est ardue si l'on considère l'immensité des besoins et l'urgence de les satisfaire. Le crédo du PUDC demeure égalité, équité et restauration d'un certain équilibre entre le milieu urbain et le monde rural pour que toutes les populations sénégalaises, où qu'elles se trouvent sur le territoire national, puissent profiter pleinement des services de l'État.

Quand nous travaillons pour un programme qui a autant fait en si peu de temps et plébiscité comme un modèle innovant de développement par plusieurs pays africains et des partenaires techniques et financiers, nous devons être plus alertes, plus engagés afin d'être encore plus performants. Fort heureusement, nous avons des ressources humaines de qualité. J'exhorte toute l'équipe ainsi que nos partenaires d'exécution à rester mobilisés afin que le PUDC renforce sa fonction d'outil d'opérationnalisation des objectifs de croissance inclusive du PSE.

Cheikh DIOP
Coordonnateur National



Focus sur l'état d'avancement des différents volets du PUDC : pistes rurales, électrification rurale, hydraulique rurale, santé, éducation et transformation agroalimentaire.

Volet Pistes Rurales

PUDC-Phase 1 : 681 km de pistes finalisés sur un objectif initial de 692 km, soit un taux de réalisation de 98%.

PUDC-Phase 2/BID : Les travaux de 61 km sont finalisés sur un objectif de 200 km. Le linéaire restant (139 km) est en cours de travaux avec un avancement moyen estimé à 65%.



Régions	Départements	Communes	Trançons	Linéaire (Km)
Kolda	Médina Yoro Foulah	Bourouco et Ndorna	Bourouco - Sare Samba Cissé - Hamdallaye - Medina Passy - Tankonfara (cf piste de Pata)	56,12
Thiès	Tivaoune	Notto Gouye Diama	Keur Mbir - Ngadiaga - Beureup Dia - Beureup Sow - Beureup Ba	10
			Notto - Keur Mallal - Keur Omar	7
		Mboro et Darou Khoudos	Mboro - Touba Tafekh - Touba Ndiaye - Darou Khoudoss - Naylou - Darou Salam Diouf & la bretelle vers Ndiouffène	14,5
Louga	Kébémér	Ndande et Kab Gaye	Ndande - Nioukhou fall, Thiar Sarr, Tallène - Ndiakane Gaye, Ngueune Peulh - Touré Ngueune - Kab Gaye	12,5
		Guéoul	Guéoul - Bandègne Wolof	11
	Louga	Kel Gueye	Kel Gueye - RN2	2
		Pété Ouarack	Pété Ouarack - Depal Mbaye	6,5
	Linguère	Kamb, Yang Yang, Ouarakhokh et Mbeleukhé	Doundodji - Ndiakhaté - Ndiané - Ngouy Diéri - Yang Yang - Mbeleukhé	28
Total pistes en cours d'exécution sous financement BID (Km)				139

PUDC-Phase 2/BAD : Sur un objectif de 300Km, 85 km sont finalisés. Les travaux sont en cours sur un linéaire de 195 km avec un avancement moyen estimé à 53%.

PUDC-Phase 2/FSD : La procédure de passation de marché est achevée pour la réalisation de 256 km de pistes. Les contrats sont signés et enregistrés. Les implantations sont en cours.



État d'avancement des différents volets du PUDC du 1er semestre 2023

Régions	Départements	Communes	Tronçons	Linéaire (Km)
Kaolack	Guinguineo	Guinguineo et Ngathie	Guinguineo - Darou Dieme - Ngoloum - Diaké - Gavane Djida	29,5
Fatick	Foundiougne	Keur Saloum Ndiané, Keur Sambaba Gueye et Niéro Alosane Fall	Keur Saloum Ndiané - Keur Sérigne Bamba - Keur Nghata - Ngayène Thiéba - Keur Aliou Diop - Daga Ndoup - Keur Samba Guèye - Keur Samba Nosso - Keur Bacary Camara - Keur Set Coumba	25
		Passy	Passy - Ndianéne - Ndioubel - Darou - Keur Momar Khoredia - Thioyène	16,5
Thiès	Thiès	Noto Diobass	Keur Ibra Fall - Baback- Sessene - Tatenne - Palam - Thioyane - Kissane	18
	Tivaouane	Pekesse	Pekesse - Paye Paye - Taiba Niang - Ndiack Ndiaye - Keur Yamar - Coki Mbacole	16,5
		Koul	Koul - Lissar - Ndiayène Lack - Keur Baba Ngom - Darou Gaye - Santhiou Sine - Golby	15
			Cf(route Pire - Diacksao) - Meume Oulof - Keur Massamba Fatim - Nguer 1 - Diana Thiendou - RN2	8
			Mékhé - Nghass	5
RN2 (Thiakéréw) - Mbouffa - Ngay Ngay - Ndiayène	4			
Diourbel	Diourbel	Ngohé et Patar Sine	Ngohé - Ndjis - Léréne - Keur Gane - Patar Sine	12,5
		Thiakhar	Lagnar (cf RN3) - Ndiabaye - Daga - Ndakh - Yarouway - Wakhal Diam	12
Louga	Kébémér	Mbacké Cadior et Sagatta	Mbacké Cadior - Mérina Sall - Thioké - Ngar Wolof - Ngar Peul - Ndiakhay - Ndiobène Dimb - Sagatta & brettele de Thiourague	28,5
		Mbacké Cadior	Mbacké Cadior - Nguiguiss Bamba	2,5
		Darou Mousty	Darou Mousty - Chicory	2
Total pistes en cours d'exécution sous financement BAD (Km)				195

Régions	Départements	Communes	Tronçons	Linéaire (Km)
Saint-Louis	Dagana	Diama et Ronkh	PK 00 - Pont Tégli - Projet Fourarate - Canal CK2 - Kheune	23,5
Fatick	Ngayokhéme	Toucar	Toucar - Ndock - Ngoning - Bari - Ngangariam	10
Diourbel	Mbacké	Mbacké et Touba Mosquée	Rond Point Touba - Touba Fall - Kawsara - Gueeb Fall	19
	Diourbel	Ndankh sene	Ndankh Sene - Mbappe	12
Thiès	Thiès	Mont Roland	Ndiaye Bopp - Kémaye - Thiaye & Brettele de Ngokh	8,3
			Cf Rte (Thiès - Mont Roland) - Pallo Youga - Pallo Dial	4,5
	Tivaouane	Mboro	Route des Niayes - Keur Pathé Ndiaye - Keur Dialal	4
Tambacounda	Tambacounda et Koumpentoum	Mérito et Niani Toucouleur	Mérito - Sillamé - Pétèle Body	27
	Koumpentoum	Kouthiaba Ouolof et Payar	Syll - Missira - Boustane - Koukouyel - Darou Salam 1	19,5
	Bakel	Moudery	RN2 - Namandiry	6,8
Louga	Kébémér	Thiomlom Fall	Cf (Rte Kébémér - Sagatta) - Ndamé Sanossi	6
		Kanéne Ndiob	Paida Fall - Mérina Sarr	12,5
	Louga	Coki et Pété Ouarack	Koki - Samba sadio wolof - Cf (piste Ouarack - Pété Ouarack)	15,5
		Kelle Gueye	RN2 (Dagour Ndiaye) - Ngana Sall	3
Kaffrine	Malem Hodar	Sagna et Paffa	Maka Béléli - Paffa	27
		Ndioum Guenth	Ndioum Guenth - Bele - Keur Iba	18
			Ndioum Guenth - Kour Ndoumbé	9
	Birkilane	Ségré Gatta	Ségré Gatta - Ndimbéré	7
	Koungheul	Missirah Wadène et Makka Yop	Missirah Wadène - Port Ndramé - Arafat - Maka Yopp & une brettele de Arafat - Ainoumani Ndramé	23,2
Total pistes en cours d'exécution sous financement FSD (Km)				256

Volet Électrification Rurale

PUDC-Phase 1 : Pour l'électrification par raccordement au réseau MT/BT, ce sont 232 villages raccordés, soit un taux de réalisation de 100% sur l'objectif du projet. Pour ce qui est de l'électrification par voie solaire, sur un objectif de 102 centrales solaires, l'installation et la mise en service ont été finalisés pour 54 villages. La réalisation des centrales solaires restantes a été transférée à l'ASER.

Projet d'Électrification de 2000 villages :

- Sur les 1 578 villages engagés en phase prioritaire, les 536 villages ont été finalisés dont 485 mis en service. 248 autres villages sont en cours de travaux.
- Sur les 04 dorsales électriques du projet, 02 sont finalisés. Il s'agit de la Dorsale « Ndioum -Linguère (187 km) » qui polarise 49 villages à électrifier et de la Dorsale « Ndiambour - Niakhene (25 km) » polarisant 31 villages.

Les dorsales électriques de « Simbandi Balante - Sonako (17 km) », de « Fafacourou- Dabo - Coumbacara (53 km) et de « Bandafassi - Salémata (69 km) » sont quant à elles en cours de travaux.

PUDC-Phase 2/BID : Pour l'électrification par raccordement au réseau MT/BT, sur un objectif de 20 villages, les 19 ont été finalisés et mis en service. Concernant l'électrification par voie solaire, 06 centrales sont finalisées sur les 19 prévues et 08 villages sont mis en service. Les 13 centrales restantes sont en cours de travaux.

PUDC-Phase 2 /BAD : La procédure de passage de marché pour l'électrification de 26 villages par centrales solaires est en cours.

PUDC-Phase 2/FSD : La procédure de passage de marché pour l'électrification de 24 villages par voie solaire est finalisée. Le contrat est signé et enregistré. Les mis-

sions d'implantations sont en cours de planification.



Volet Hydraulique Rurale

PUDC-Phase 1 : 268 systèmes d'alimentation en eau potable sont mis en place dont 171 systèmes AEMV et 97 systèmes mono village.

PUDC-Phase 2/BID : Sur les 30 systèmes AEMV, 28 sont finalisés et mis en service. En outre, sur 25 forages MFT, 14 sont finalisés et réceptionnés.

PUDC-Phase 2 /BAD : Les travaux de forage sont finalisés pour 31 sites sur 40 prévus. Concernant les travaux de génie civil pour la réalisation de chateau d'eau, celle-ci est finalisée pour 31 sites. Ainsi, sur les 40 systèmes AEMV du projet, 18 ont été finalisés et mis en service, 02 systèmes en cours de pré-réception et 05 autres systèmes sont en cours de finalisation.

PUDC-Phase 2/FSD : Pour la réalisation de 06 systèmes SAEMV, les contrats sont signés et enregistrés. Les réunions d'informations villageoises sont en cours de planification. Pour la réalisation de 10 forages MFT, le rapport d'évaluation est transmis au FSD pour avis de non objection.

PUDC-BCI 2023 : Sur 16 forages prévus 14 sont réceptionnés. Les travaux des châteaux d'eau ont démarré.



Volet Santé

PUDC-Phase 2/BID : Les travaux sont en cours pour la réalisation de 20 postes de santé équipés dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda avec un avancement moyen estimé à 47%.

PUDC-Phase 2 /BAD : Les contrats sont en cours de signature pour la construction de 20 postes de santé et le marché pour leur équipement est lancé.

PUDC-Phase 2 /FSD : Les travaux pour la construction des 20 postes de santé sont en cours. Pour l'équipement des postes, les propositions d'attribution des marchés sont en attente d'ANO du FSD.

PUDC-BCI 2023 : Les travaux de réalisation

de 02 postes de santé sont en attente de démarrage.



Régions	Départements	Communes	Villages	
Ziguinchor	Bignona	Oulampane	Kandiadiou Ouel Kalir	
		Kataba 1	Médina Daffé	
		Bignona	Tenghory Transgambienne	
		Djinaky	Biti Biti	
Sédhiou	Boukiling	Tankon Diambaty	Saré Hamassamba 2 Bayamba	
	Sédhiou	Djirédji	Touba Madina Souané	
		Bennet Didjini	Sibicouroto 2	
	Kolda	Vélingara	Koulinto	Diambanouta
Saré Coly Sallé			Teyel	
Bonconto			Darou Hidjiratou	
Médina Yoro Foulah		Niaming	Maroume Maoundé	
		Kéréwane	Diakhaly	
		Médina Gounass	Médina Touath	
Kolda		Saré Bidji	Saré Bilaly	Saré Moussa Méta
			Coumbacara	Dialacoumbi
		Ndorna	Tanconfara	

Tableau des postes de santé en cours de réalisation sous financement BID

Volet Éducation

PUDC-Phase 2/BID : Sur les 21 infrastructures scolaires prévues, les travaux se déroulent sur 14 sites avec un avancement moyen estimé à 54%. Pour la construction des 07 infrastructures scolaires restantes, les travaux ont démarré.

Volet Transformation Agroalimentaire

Équipements de transformation post-récolte

PUDC-Phase 1 : 5079 équipements ont été déployés au bénéfice des femmes en milieu rural. Les comités de gestion des dits équipements ont été mis en place et les membres sont formés à l'utilisation, à la gestion et aux premières opérations de maintenance.

PUDC-Phase 2/BID : 270 équipements ont été livrés et 29 autres sont en cours de production dont 14 réceptionnés en usine. L'ensemble des abris ont été construits par les bénéficiaires. Les comités de gestion sont mis en place et les membres formés à l'utilisation.

PUDC-Phase 2 /BAD : La production de 198 équipements est finalisée sur les 448 équipements du projet. La fabrication des 250 équipements restants est en cours de finalisation.



Périmètres agricoles communautaires

PUDC-Phase 1 : 123 périmètres agricoles communautaires (PAC) ont été aménagés au bénéfice de Sociétés Agricoles rurales (SAR).

PUDC-Phase 2 BID et BAD : Sur les périmètres de la Phase 1, 23 ont été sélectionnés pour être dotés de réseau d'irrigation et de point d'eau autonome. L'ensemble des réseaux d'irrigation sont installés et le marché pour la réalisation des points d'eau est en cours de relance. 34 autres périmètres communautaires sont en cours de clôture.

Plateformes de transformation agroalimentaire

PUDC-Phase 2/BID : Les travaux de construction de 04 PTA ont démarré. Les contrats pour la fourniture d'équipements de ces PTA sont signés.

PUDC-Phase 2 /BAD : La procédure de passation de marché pour les 10 PTA est en cours.

PUDC-Phase 2 /FSD : La procédure de passation de marché pour les 15 PTA est en cours.

Magasins de stockage

PUDC-Phase 2/BID : Les travaux de construction de 02 magasins de stockage sont en cours.

PUDC-Phase 2 /BAD : Les contrats pour la construction des 31 magasins de stockage sont signés et les travaux sont en attente de démarrage.

Unités laitières

PUDC-Phase 2/BID : Les travaux de construction de 06 unités laitières sont en cours. Les contrats pour les équipements de 08 unités laitières sont signés et enregistrés.

Bio digesteurs

PUDC-Phase 2/FSD : La convention entre le PUDC et le Programme national de Biogaz pour la mise en place de 25 bio digesteurs est en cours d'exécution.

Dar Salam accède aux commodités de l'électricité

Le hameau de Dar Salam est situé à 12 km de la commune de Tambacounda. Maisons en argile et autres cases rustiques accueillent les visiteurs qui arrivent chez cette communauté essentiellement composée de Bambaras.



“ Les accouchements à risque faute d'électricité ne sont plus qu'un mauvais souvenir. ”

Entouré de champs de maïs, le village respire une énergie nouvelle grâce aux travaux d'électrification entrepris par le PUDC. Emblème incontesté de la localité le poste de santé connaît un dynamisme nouveau depuis qu'il a été raccordé au réseau électrique. De l'avis de l'infirmier chef de poste « les accouchements à risque faute d'électricité ne sont plus qu'un mauvais souvenir ».





“ La disponibilité de l'eau est permanente au niveau du forage et en période de canicule la vente de glace est très lucrative. ”

D'autres récits entourant l'arrivée de l'électricité illustrent la joie incommensurable des populations.

« La disponibilité de l'eau est permanente au niveau du forage et en période de canicule la vente de glace est très lucrative » renchérit Dembo Camara un jeune du village pour qui « c'est le développement dans tous les sens ». On y rencontre des femmes pleines de vie et des jeunes ambitieux car désormais le village est devenu un véritable havre de plénitude et de tranquillité. La nuit, quand les lampes s'allument, c'est un sentiment de bien-être et de sécurité qui anime les habitants.




Projet d'électrification de 2000 villages : de l'ombre à la lumière

Dans le cadre de l'accès universel à l'électricité, le Sénégal a élaboré un programme intégré d'investissement aux services électriques durables à l'horizon 2025 en vue de combler le gap de financement, tenant compte de la contribution des sociétés d'électricité (autofinancement notamment), des consommateurs (tarifs) et de celle de l'État (subvention, contribution en capital, etc.).



C'est dans ce contexte que l'État du Sénégal a obtenu, à travers ses partenaires, un financement Public/Privé pour mettre en œuvre un projet d'électrification rurale de 2000 villages afin de rehausser le taux de couverture sur le plan national et tendre vers son objectif d'accès universel.

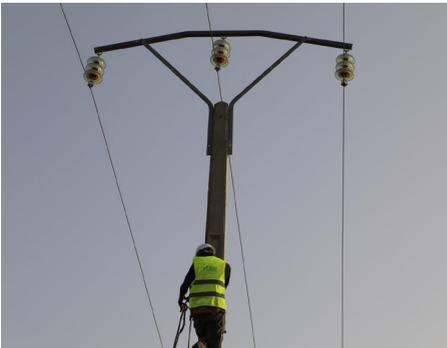

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'actions prioritaires accéléré et ajusté PAP2A; le PUDC entend appuyer les stratégies d'adaptation et structurer une réponse adéquate à court terme aux effets du ralentissement de l'économie pour les couches les plus vulnérables en milieu rural.

Le projet s'articule autour de deux composantes :

1. Composante 1 : Dorsales électriques

Cela concerne la construction des dorsales électriques qui sont des lignes moyenne tension à forte capacité de transit qui permettent :


- d'une part de faire l'interconnexion des réseaux électriques issues des différents postes source de Senelec.
- d'autre part de densifier le réseau des distributions dans les zones non encore desservies.

Ainsi sur ces dorsales seront connectées des antennes moyenne tension servant à alimenter les villages programmés pour être électrifiés.



Dans le cadre de ce projet, il est prévu la réalisation des dorsales suivantes :

Dorsales	Régions desservies
Fafacourou - Dabo - Coumbacara	Kolda
Linguère - Téssékéré - Ndioum	Louga - Saint-Louis
Simbandi Balante - Sonako	Sédhiou
Ndiambour - Niakhène	Thiès - Diourbel
Bandafassi - Salémata	Kédougou

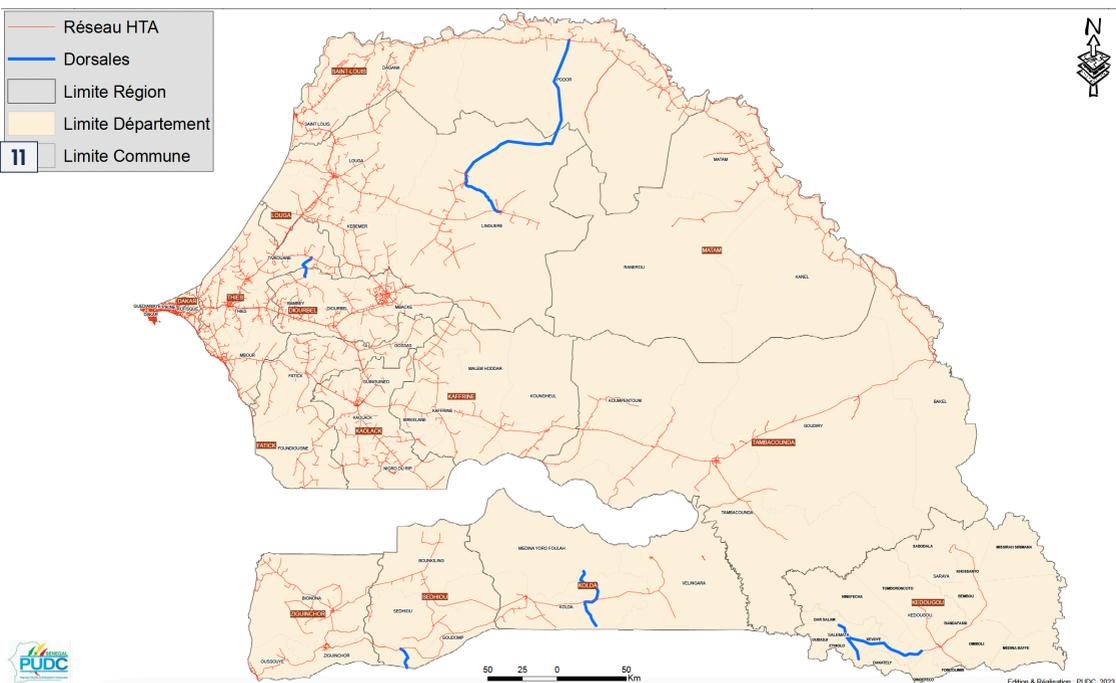

Carte des dorsales

2. Composante 2 : Électrification de 2000 villages

Cette composante du projet consiste à l'électrification de 2000 villages qui seront alimentés à partir de la 1ere composante Dorsale ou raccordés à partir du réseau moyenne tension de la Senelec.



État d'exécution du projet

Les travaux ont démarré au mois de Mars 2021. Pour la tranche ferme du projet, 1 203 villages ont été engagés. Après 24 mois d'exécution :

- les travaux ont été finalisés dans 536 villages, dont 485 villages mis en service;
- 248 autres villages sont en cours de travaux.

Pour la composante dorsale, l'état d'avancement est donné ci-dessous:

Impacts du projet 2000 villages

En 2018, 4 460 052 personnes vivant dans le monde rural ont eu accès au service électrique. Ceci a permis d'avoir un taux de couverture de 52%.

Avec les projections en fin 2021, 13 819 localités resteront sans électricité avec une population estimée à 2 997 937 habitants.

Ce projet permettra d'électrifier 15% des localités qui restent à couvrir.

Une évolution de 10 à 12% sera notée sur le taux de couverture électrique après réalisation des 2000 villages avec une population impactée de 880 922 personnes.



Régions	Dorsales	Linéaire	Niveau d'exécution
Saint-Louis - Louga	Linguère - Téssékéré - Ndioum	170 Km	Finalisé et mis en service
Thiès - Diourbel	Ndiambour - Niakhène	23 Km	Finalisé et mis en service
Kolda	Fafacourou - Dabo - Coumbacara	53 Km	60%
Sédhiou	Simbandi Balante - Sonako	17 Km	86%
Kédougou	Bandafassi - Salémata	69 Km	Travaux en cours

Depuis 2015, les résultats suivants ont été obtenus par le PUDC :

Pistes Rurales

827 km de pistes rurales sont ouverts à la circulation permettant d'améliorer la mobilité de plus de 528 000 personnes répartis dans 844 villages.



Énergie

837 villages (60 par centrales solaires et 777 par réseau MT/BT) ont été finalisés dont 801 sont mis en service (60 par voie solaire et 741 par raccordement au réseau MT/BT) pour un accès à l'électricité à plus de 760 000 personnes.



Hydraulique

325 systèmes constitués de **217 systèmes AEMV** et de **108 forages MFT** ont été mis en service par le PUDC pour un accès à l'eau potable à plus de 615 000 personnes dans 1 772 villages.



Transformation agroalimentaire

5 349 équipements de transformation post-récolte ont été déployés par le PUDC, au profit des populations rurales dans 4 874 villages.



123 périmètres agricoles communautaires (PAC) ont été aménagés en phase 1, dont 14 mis en valeur avec un système d'irrigation autonome avec le projet BID et 23 autres sont en cours d'aménagement dont 08 finalisés avec un réseau d'irrigation autonome et un point d'eau autonome sur l'ensemble des 23 périmètres avec le projet en partenariat avec la BAD. L'aménagement par clôture de grillage de 34 autres périmètres agricoles communautaires est en cours.



Production :
Cellule Communication du PUDC
Avec l'appui de l'ensemble des experts du programme



PROGRAMME D'URGENCE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Un levier pour l'essor du monde rural

Nos partenaires :



Pour plus d'informations :

+221 78 638 02 26

pudc.sec.gouv.sn

Immeuble SCI Faalo (abritant le UNHCR), Almadies - Route du King Fahd Palace

[Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#) [YouTube](#) PUDC SÉNÉGAL

info@pudc.gouv.sn
